Informações da Obra	
Custo Total da Obra (CTO)	R$ 8.881.626,00
Custo Total da Área Privativa (CTAP)	R$ 5.773.056,90
Custo Total da Área Não Privativa (CTANP)	R$ 3.108.569,10
Padrão	Alto
Zoneamento	Residencial
Tipologia	5 Tipo + térreo+ garagem + PUC
Número de Pavimentos Tipo	5
Outros Pavimentos	3
Unidades	20
Área do Terreno (m²)	2314,29
Área construída total (ACT) (m²)	4200,00
Área Privativa Total (APT) (m²)	2000,00
Área Não Privativa Total (ANPT) (m²)	2200,00
Taxa de APT/ACT	47,62%
CTO / ACT (/m²)	R$ 2.114,67
CTO / APT (/m²)	R$ 4.440,81
CTAP / APT (/m²)	R$ 2.886,53
CTAP / APT (/m²)	R$ 1.412,99

Prazos da Obra	
Início	24/04/25
Fim	19/05/26
Fim Plan	11/05/26
Atraso	5,00
Previsão	18/05/26

Termômetro Financeiro
-R$ 273.883,38

Serviços de Obra	
Status	12,48%
Pendente	87,52%
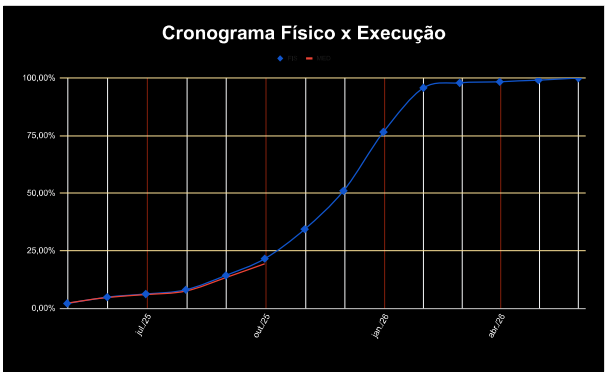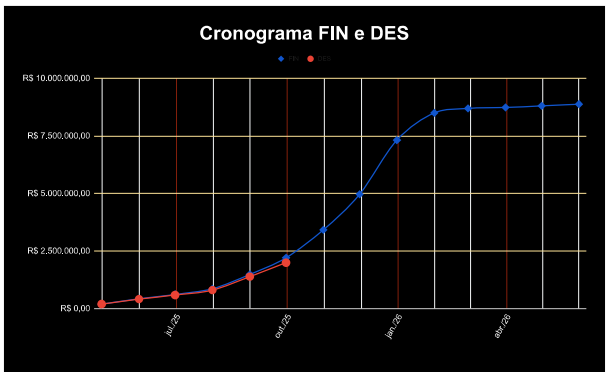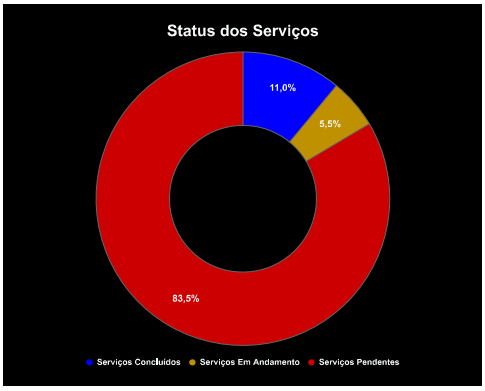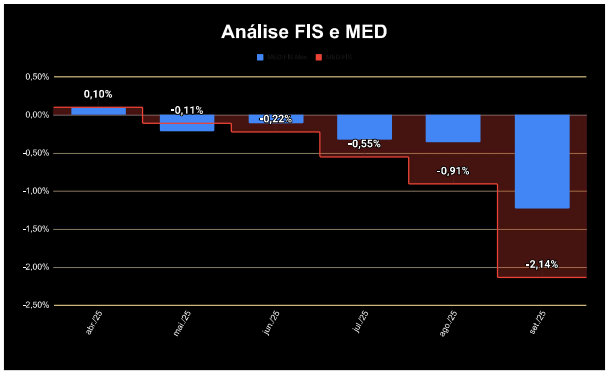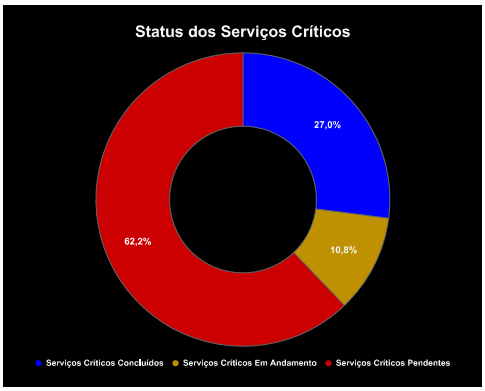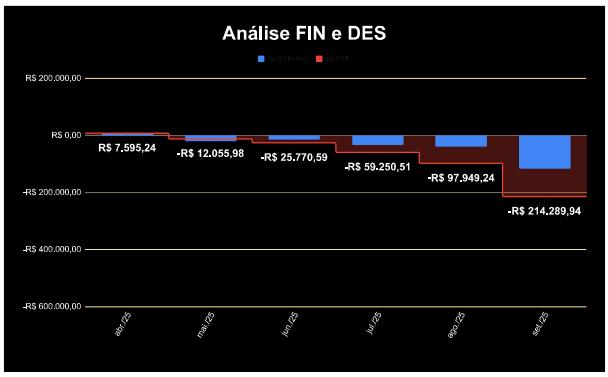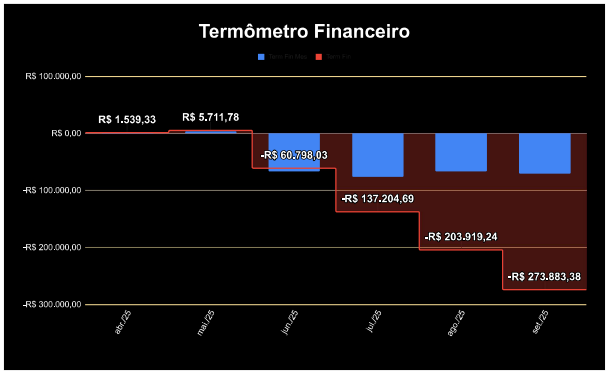
Caminho Crítico	
Status	28,94%
Pendente	71,06%
